

北屯區敦富九街 12M-5 銜接潭 子中興路開闢工程

既有樹木移除計畫 【第二版】

契約編號：114A-014

主辦單位：臺中市新建工程處(土木工程科)

設計監造：旭基工程顧問有限公司

施工廠商：竣溢營造有限公司

中華民國 114 年 08 月

樹木移植施工計畫書審查意見表

審查單位：臺中市政府建設局景觀及植栽委員會 114 年度第 24 次小組審查會議		審 查 時 間	114 年 7 月 24 日
審 查 意 見編號	會簽意見		回覆情形
1	請補充補植位置。		遵照辦理，詳細補植地點內容說明，請詳見本計畫書第 13 頁。
1	建議補植樹種光臘樹可改為 6~8 公分青剛櫟，並選用完整樹形、袋植苗。		遵照辦理，詳細補植地點內容說明，請詳見本計畫書第 13 頁。
1	請於適當季節(春季)進行補植。		於工期內適當季節進行補植(工期內目前最佳種植時間為秋季 9~11 月)，請詳見本計畫書第 13 頁。
2	請確認補植間距應有約 6 米。		遵照辦理，相關補植地點及間距說明，請詳見本計畫書第 13 頁。
3	新工處公園景觀工程科目前有多處開闢公園，建議優先媒合至公園進行補植。		遵照辦理，相關補植地點及間距說明，請詳見本計畫書第 13 頁。
決議			
1	同意移除 1 株小葉欖仁，補植位置建議以公園為主(補植間距約 6 米)。		遵照辦理。
2	請依委員意見修正補充相關資料後，授權業務單位(公園景觀管理科)審視資料無誤後通過。		遵照辦理。
3	請於完工 1 個月後報請養護工程處公園景觀維護科更新友善樹木空間資訊管理系統資訊。		遵照辦理。

目錄

壹、現況分析.....	1
一、移除原因說明.....	1
貳、工程概要.....	2
一、施工概述.....	2
二、申請移除行道樹現況.....	3
三、行道樹木樹籍資料.....	6
四、樹木健診紀錄.....	7
五、健診結果結論.....	9
參、 施工計畫.....	10
一、移除施工流程：.....	10
二、移除作業步驟說明.....	11
三、補償種植作業.....	13
四、環境復原作業.....	15
五、施工預定進度：.....	15
六、執行經費預算表.....	16
七、施工機具設備及人員數量.....	16
八、喬木移除工程人員組織圖.....	17
九、監督人姓名及資歷.....	18
十、施工期間交通安全之保護措施.....	21
十一、植栽移除工程施工管理.....	22
肆、附件.....	24
附件 1 - 契約書.....	24

圖目錄

圖 1 施工範圍	1
圖 2 申請移除喬木位置示意圖	3
圖 3 樹木友善系統查詢結果	6
圖 4 樹木健診紀錄表	8
圖 5 移除施工流程圖	10
圖 6 修剪吊掛示意圖	11
圖 7 機具開挖示意圖	12
圖 8 喬木吊掛示意圖	12
圖 9 預定補植配置圖	13
圖 10 支架設置示意圖	14
圖 11 移除工程人員組織圖	17
圖 12 監督人姓名資歷	18
圖 13 交維布設作業圖	21
圖 14 本案交維布設示意圖	21

表目錄

表 1 工程主要施工項目表	2
表 2 申請移除喬木樹種及規格表	3
表 3 申請移除喬木樹籍資料表	6
表 4 健診結果統計表	9
表 5 預計補償種植樹種規格表	13
表 6 管理養護項目說明表	15
表 7 施工預定進度表	15
表 8 執行經費預算表	16
表 9 施工機具設備表	16
表 10 施工人員數量表	16
表 11 監督人員證照表	20
表 12 植栽移除工程施工管理標準表	22
表 13 植栽移除工程施工自主檢查表	23

壹、現況分析

一、 移除原因說明

本申請案件為因「北屯區敦富九街 12M-5 銜接潭子中興路開闢工程」，其中有 1 株喬木位於道路開闢工程範圍內，故提出申請喬木移除作業。

有關「北屯區敦富九街 12M-5 銜接潭子中興路開闢工程」圖說及位置圖，如下：



圖 1 施工範圍

貳、工程概要

一、施工概述

- (1) 工程名稱：北屯區敦富九街 12M-5 銜接潭子中興路開闢工程
- (2) 工程主辦機關：臺中市新建工程處
- (3) 設計單位：旭基工程顧問有限公司
- (4) 監造單位：旭基工程顧問有限公司
- (5) 施工單位：竣溢營造有限公司
- (6) 工程地點：北屯區
- (7) 工程期限：210 日曆天。
- (8) 工程主要施工項目：

表 1 工程主要施工項目表

項次	項目及說明	工項內容及數量
1	新闢道路	新闢 12m 都市計畫道路
2	橋梁工程	一座
3	樹木移除工程	1 株

二、申請移除行道樹現況

有關本次提送申請之 1 株喬木，詳細樹種及規格說明，如下表：

表 2 申請移除喬木樹種及規格表

編號	樹種	樹徑(cm)	樹幅(m)	樹高(m)	樹穴大小(m)
1	小葉欖仁	40.5	2	8	連續樹穴


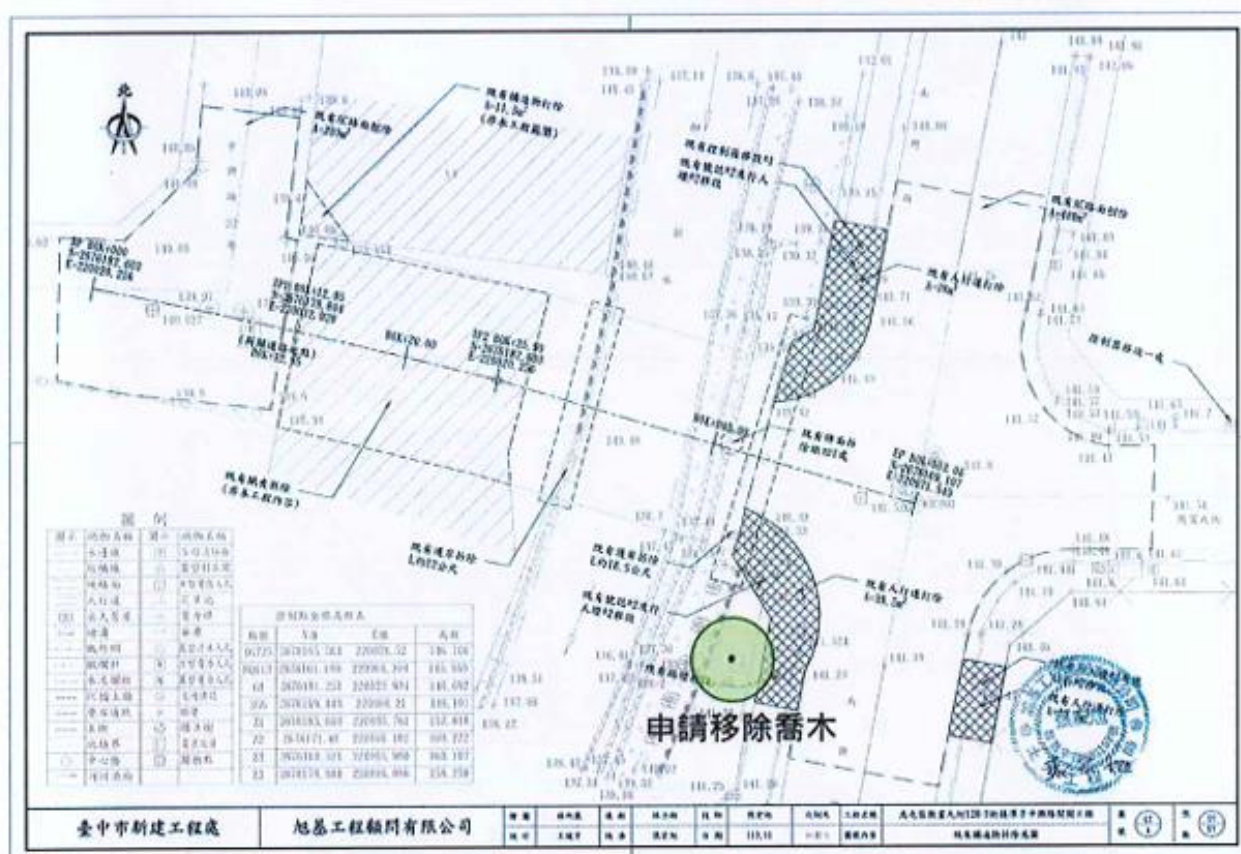


圖 2 申請移除喬木位置示意圖

編號	樹種	樹徑(cm)	樹幅(m)	樹高(m)	樹穴大小(m)
1	小葉欖仁	40.5	2	8	連續樹穴



連續樹穴與周邊物件

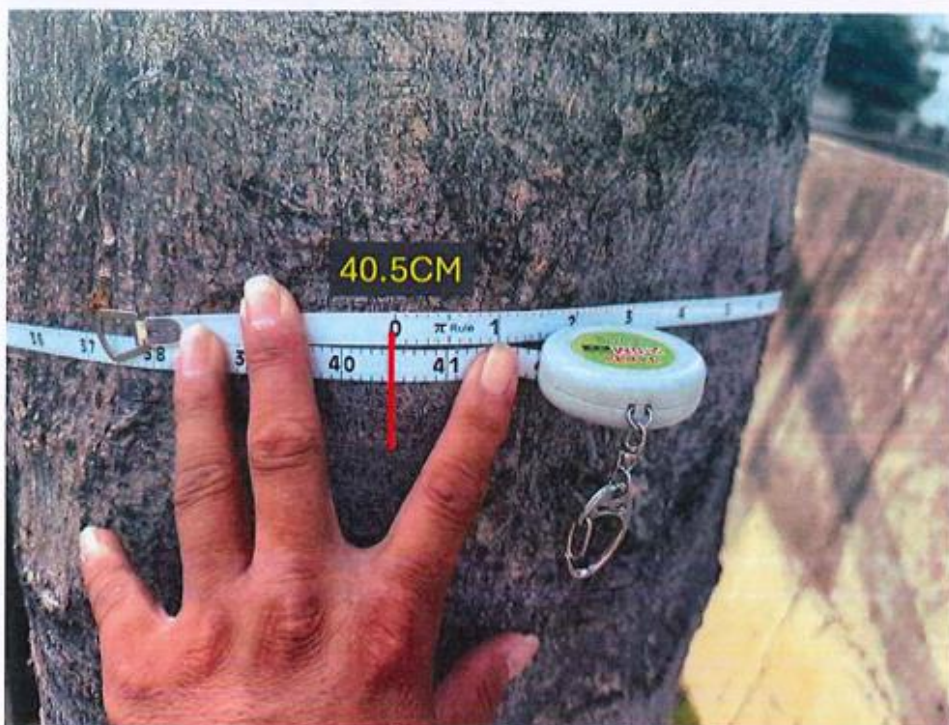

1. 樹穴為連續樹穴，但申請樹木緊鄰橋墩及邊坡，且樹穴寬度僅150cm，土球完整空間不足。
2. 申請樹木右側緊鄰橋墩約70公分，左側緊鄰路燈約150公分。

三、 行道樹木樹籍資料

經確認本次申請 1 株喬木，於「臺中市政府建設局友善樹木空間資訊管理系統」中查詢有樹籍資料 (如下表 3)。

表 3 申請移除喬木樹籍資料表

編號	樹種	樹徑 (cm)	樹幅 (m)	樹高 (m)	樹穴大小 (m)	樹籍編號
1	小葉欖仁	40.5	2	8	連續樹穴	109TC_0000041968



圖 3 樹木友善系統查詢結果

四、 樹木健診紀錄

本次申請喬木委請專業老師至現場進行樹木健診作業，其健診結果為「建議移除」，其健診過程說明及健診單如下：

編號	樹種	樹徑(cm)	樹幅(m)	樹高(m)	樹穴大小(m)	健診結果
1	小葉欖仁	40.5	2	8	連續樹穴	建議移除



1. 緊鄰護岸，且緊鄰燈桿，無法挖掘土球。

2. 樹型傾斜，主幹多處傷創且為嫁接苗，外來速生樹種，無移植價值。

3. 建議移除為宜。

編號 1 小葉欖仁 - 健診紀錄單

臺中市養護工程處 樹木健診紀錄	
事由	樹木健康診斷
時間	114年6月2日
地點	南興路、致富九仔路口
出席人員	
紀錄	
診斷內容 小葉欖仁 X1: 植株定植於路口側 聲部 護岸、號誌灯桿、定國灯 杆型傾斜、主幹多處傷痕 且為嫁接苗(恐不為欖仁), 外來速生樹種, 定植位置無法 挖掘工球, 無移植價值, 建議移除為宜。 以利進路銜接具橋樑鋪設	
簽章: [Redacted]	

圖 4 樹木健診紀錄表

五、 健診結果結論

經樹木健診，本次健檢 1 株小葉欖仁建議列為移除，並且經移除後預計辦理補償種植作業。

表 4 健診結果統計表

編號	樹種	樹徑 (cm)	樹幅 (m)	樹高 (m)	樹穴大小 (m)	健診 結果
1	小葉欖仁	40.5	2	8	連續樹穴	建議 移除

參、 施工計畫

一、 移除施工流程：

施工前勘查→移除作業→挖掘及打包→運棄→樹穴整理



圖 5 移除施工流程圖

二、移除作業步驟說明

(1) **事前通告：**施工前十日，在預定作業地點及周邊張貼告示，標明施工時間、範圍及施作單位，注意環境安全及交通疏導事宜。

(2) **移除作業時修剪工作及保護：**

- I. 移除過程不得有手法粗暴之情事。
- II. 樹冠修剪作業(修剪至分枝處，可將枝葉修除，亦可保留約 1/4)。
- III. 樹木主幹保護(施工機具接觸點有包材保護，或樹身用包覆材遮蔽)。
- IV. 非必要時避免截頂及直接裁切分段；特殊狀況除外，例如緊鄰民宅、建築採光罩、高壓電線、電箱、自來水管線、瓦斯管線等公共設施管路及交通號誌等。
- V. 路段或同區域先行一次性修剪，再進行後續工作。
- VI. 確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材(人員、機具等)到位方才施作。另修剪及移除時，聘請監看人員全程監看。

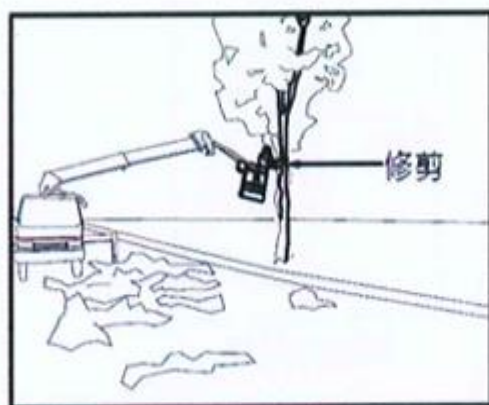


圖 6 修剪吊掛示意圖

(3) **挖掘：**

- I. 情況增加固定主幹，避免樹木傾倒。
- II. 確定開挖範圍(依現況調整開挖範圍)
- III. 使用切割機切割新舊邊界。
- IV. 鑿除硬鋪面。

V. 機具開挖根球部位並配合人力開挖(依現況調整)。



圖 7 機具開挖示意圖

(4) 吊運及運棄：

- I. 確認吊裝工具與樹木是否固定安全。
- II. 必要時以機具輔助樹木吊搬脫離樹穴。
- III. 吊運上車運離作業(運輸車體須覆蓋或遮蔽)。
- IV. 吊車等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固。

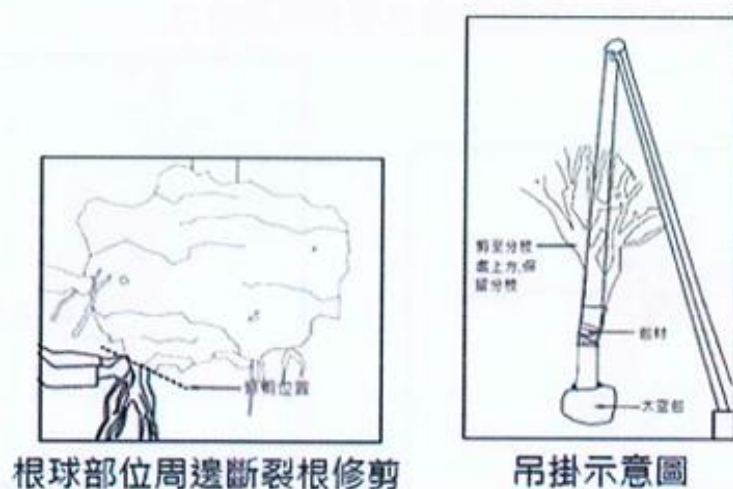


圖 8 喬木吊掛示意圖

三、補償種植作業

1. 補償樹種說明：申請移除小葉欖仁 1 株後，將辦理補償種植作業，預計於工期內適當季節進行補植(工期內目前最佳種植時間為秋季 9~11 月)並補償種植 5 株樹徑 6~8 公分之青剛櫟，其補償種植地點，預計補植於「113 年度臺中市公園新闢及景觀改善工程(派工編號 05)-西屯區兒 132 用地新闢綠美化工程」，補植間距約 6 公尺。

表 5 預計補償種植樹種規格表

預計 補植樹種	規格(cm)			土球大小 (cm)
	樹高	樹冠	樹徑	
青剛櫟 5 株	300	100	6~8	約 30cm

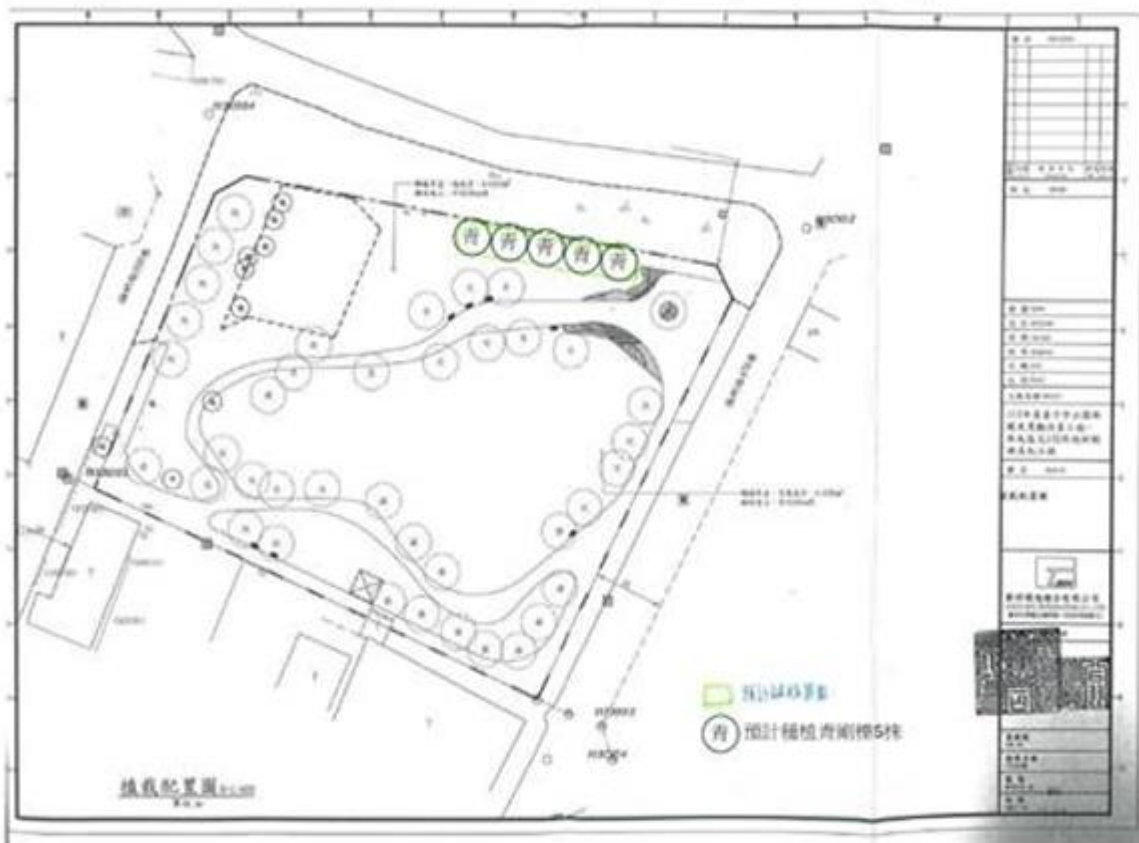


圖 9 預定補植配置圖

2. 補償種植步驟說明

(1) 客土：

以客土方式改良土壤結構系道路綠美化基本的措施。將不良之植穴土壤，以表土等良質土替換，如無法取得表土，可將附近較好的土壤作為母才，加入完全腐熟之有機質肥料為基肥，混合均勻供為客土之用。

含有機質。不應含有石礫、混凝土塊及有礙根系發展之雜物。

(2) 定植點植穴挖掘：

將預定種植的位置依設計圖標記於施工現場，植穴大小以根球直徑4-6 倍作為開挖寬度為宜，深度為根球直徑加深二十公分以上。植穴內的石礫、混凝土塊及基地上有礙根系發展的雜物均應清除並棄運。

(3) 種植：

將挖好的植穴底部鋪設適量客沃土及基肥，使成饅頭形，以利植株根球底部密接土壤。樹木根球頂端須略高於地表3~5 公分，避免日後下陷積水。固定後於四周均勻回填表土及客土回填。種植時應將細綁土球之材料清除後，將樹木輕輕放入植穴中，並將周圍土壤以表土先，心土後之順序，填入根球周圍，利用木棒將土壤搗實，密接根系，如此逐層加土壤至地表為止，並在地際幹徑5~6 倍外圍地面，施築「土圍」，以利截留貯存水份。

(4) 支柱架設：

支架採已經過防腐處理的竹柱，保護架插入地下應有足夠之深度，其架設高度約為主幹2/3 處，每組保護架之角度力求一致。保護架與樹幹靠接處，應以軟厚材料保護之，以免樹皮受損，並應將繩索細綁牢固。

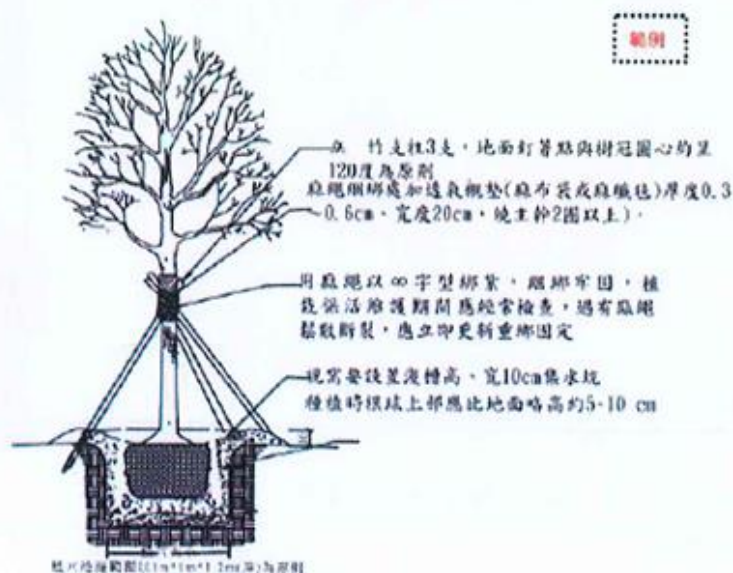


圖 10 支架設置示意圖

(5) 補植後之管理維護：

- A. 補植後立即充分灌水，並避免於午間高溫炎熱時澆灌。
- B. 養護期間亦需適時澆水避免乾旱缺水，並負責一年之維護存活。

表 6 管理養護項目說明表

養護項目	項目說明
澆灌水作業頻率	原則每周二次，視氣候而定。
植穴排水管理	每次澆水後注意排水狀況，如遇天災或豪雨時須加強注意排水。
除草作業期程	樹穴草長不超過 10 公分為原則，並注意不傷及根部。
施肥作業期程	3 個月施追肥一次
病蟲害防治之方式	如發現感染病蟲害，將邀請專家協助檢視，並通知管理單位。

- (6) 澆水作業：定植完成之後，配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤，原則每周二次，視氣候而定。
- (7) 植穴基盤管理：維護管理期間內，日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。
- (8) 施肥作業：維護管理期間，將針對樹木現況、須肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。施追肥應注意肥料種類、施肥方法、施肥用量及施肥時期，以達成最佳效益。選用與施給有機質肥料產品時，須依照肥料產品說明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。

四、環境復原作業

本案施作範圍後續為道路開闢工程施工區域，喬木移除後進行樹穴整平，後續交由開闢工程執行。

五、施工預定進度：

表 7 施工預定進度表

項次	工程項目	預定開始日期	預定完成日期	工期 (日曆天)
一	事前通告	計畫通過後 10 日	計畫通過後 10 日	1
二	移除工作	計畫通過後 20 日	計畫通過後 20 日	1
三	環境復原	計畫通過後 20 日	計畫通過後 20 日	
四	補償種植	秋季 9~11月		

六、 執行經費預算表

表 8 執行經費預算表

項次	工項	單位	數量	單價	複價	備註
1	樹木移除(φ:31~50cm 以下)	株	1	15,890	15,890	(含殘枝落葉廢 棄物清運費)
2	青剛櫟(φ:6~8cm)	株	5	7,900	39,500	(含支架、土壤 改良)

七、 施工機具設備及人員數量

表 9 施工機具設備表

項次	機具設備	需用時間 數量	需用時間及數量
			計畫經景委會通過後
1	挖土機		1
2	鏟土機		1
3	電鋸		1
4	高空作業車		1
5	抓斗車		1
6	吊卡車		2

表 10 施工人員數量表

項次	人員	需用時間 數量	需用時間及數量
			計畫經景委會通過後
1	工地負責人		1
2	工地領班		1
3	現場施工人員		2
4	交管人員		2
5	監看人員		1

八、 喬木移除工程人員組織圖



圖 11 移除工程人員組織圖

九、 監督人姓名及資歷

本工程委託濬廣企業有限公司負責移除施工，由該公司黃[REDACTED]先生擔負責移除施工及擔任本工程監督人員，其職掌及資歷如下：




圖 12 監督人姓名資歷

監督人員職掌：

- 1、工地範圍內之部署及配置。
- 2、人員、材料、機具、設備及施工裝備之管理。
- 3、工地安全之維護及突發事故之處理。
- 4、開工前之準備，包括施工計畫、施工預定進度表、交通維持計畫之研擬、申報。
- 5、向機關提出施工動態（開工、竣工）書面報告。
- 6、協調相關廠商研商施工配合事項。
- 7、施工品管有關事項及施工瑕疵之改正、改善。
- 8、工地內外環境清潔，污染及噪音防治。
- 9、工地週邊地區交通之維護及疏導事項。
- 10、加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。

工程資歷：

- 106年度清水區公68公園綠美化維護工作
- 106年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植維護改善工作(開口契約)
- 107年度烏日區公園、廣場綠美化維護管理(開口合約)採購
- 臺中市太平區麗園1007地號空地綠化植栽工程
- 臺中市太平區光華段1-1地號空地綠化植栽工程
- 108年度臺中市養護工程處第四工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區
- 108年烏日區公園、廣場綠美化維護管理(開口合約)採購
- 臺中市南區復興建成營區閒置空間綠美化工程
- 108年臺中市政府運動局所轄運動場地樹木修剪及砍除開口契約勞務採購契約
- 108年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(下半年度)
- 109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(第一工區)(大里、太平及鄰近區域)
- 109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(第二工區)(大肚、霧峰、烏日、龍井及鄰近區域)
- 臺中市109年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區
- 臺中市110年度公園廣場樹木高空修剪工程-第一工區(南區、南屯區、西屯區)
- 臺中市110年度行道樹高空修剪工程(屯區)
- 臺中市110年度行道樹高空修剪工程(大甲、大安、外埔、清水、沙鹿及梧棲等區)
- 臺中市110年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區
- 臺中市110年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-水湳經貿園區
- 臺中市111年度行道樹高空修剪工程(屯區)
- 臺中市111年度行道樹高空修剪作業(大甲區、大安區、外埔區、清水區、沙鹿區及梧棲區)
- 西屯區市政路延伸工程-植栽移植標
- 111年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-水湳經貿園區
- 臺中市111年度園道綠地行道樹植栽改善工程(水湳經貿園區、草悟道及鄰近區域)
- 臺中市111年度園道綠地行道樹植栽改善工程(水湳經貿園區、草悟道及鄰近區域)(第二次後續擴充)
- 臺中市112年度行道樹高空修剪工程(屯區)
- 112年度臺中市養護工程處潭子、大雅、神岡、后里等鄰近區域植栽及景觀等改善工程
- 112年度臺中市養護工程處潭子、大雅、神岡、后里等鄰近區域植栽及景觀等改善工程(第一次後續擴充)
- 112年度臺中市14期重劃區及鄰近區域綠色環境美化工程
- 112年花之道統包工程

表 11 監督人員證照表

臺中市政府建設局景觀樹木種植與移植研習認證 (112 回訓)  臺中市政府 TAICHUNG CITY GOVERNMENT 臺中市政府建設局 發	臺中市政府建設局景觀樹木種植與移植研習認證 (112 回訓) <table border="1"> <tr> <td>證書字號</td> <td></td> <td>出生日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中文姓名</td> <td>黃</td> <td>身分證統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>英文姓名</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>生發日期</td> <td colspan="3">民國 112.09.22</td> </tr> </table> 備註：四年回訓 臺中市政府建設局 發	證書字號		出生日期		中文姓名	黃	身分證統一編號		英文姓名				生發日期	民國 112.09.22		
證書字號		出生日期															
中文姓名	黃	身分證統一編號															
英文姓名																	
生發日期	民國 112.09.22																
中華民國技術士證 身分證統一編號 出生日期 技術士證 證號 136-0015405 職類(項) 造園景觀 名稱 生效日期 民國111年07月07日 製發日期 民國111年07月07日	Technician Certificate, Republic of China Certificate No. 136-0015405 This is to certify that ID No. M121454438 born on May 12, 1977 has passed the required skills certification of class C skill category of Gardening Landscape thus has been duly certified, effective date: July 7, 2022  0 073650115																
勞工安全衛生教育訓練 結業證書 <table border="1"> <tr> <td>證書字號</td> <td>105M00608030103</td> <td>編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td></td> <td>出生日期</td> <td>66.05.1</td> </tr> <tr> <td>身分證統一編號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 訓練單位 財團法人中國生產力中心附設中國職業訓練中心 訓練種類 中國職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練 訓練日期 105.07.16至105.09.04 證發日期 105.09.23 臺中市政府勞工局勞工安全衛生科 1050007110號 	證書字號	105M00608030103	編號		姓名		出生日期	66.05.1	身分證統一編號				中華民國技術士證 身分證統一編號 出生日期 技術士證 證號 133-015745 職類(項) 園藝 名稱 生效日期 民國103年06月24日 製發日期 內級				
證書字號	105M00608030103	編號															
姓名		出生日期	66.05.1														
身分證統一編號																	

十、 施工期間交通安全之保護措施

1. 移除作業進行工作期間，現場工程人員將全程配戴施工安全帽及個人防護設備，維護及保障施工環境之安全性。
2. 移除作業期間進行車輛進出管制，施工中佔用之道路於交通繁忙時，指派專人負責交通維持，避免危害發生。
3. 進行樹木移除作業前，根據路況調查等，實施交通維持措施及管制計畫。
4. 工區前漸變區段布設交通錐及連桿，駕駛人有一段時間調整其行車速度，及作變換車道準備，放置車輛改道告示牌，並安排 1~2 位交通維持人員，協助維持交通。
5. 本案施作時，因預計移除喬木臨南興路與敦富九街路口，施作時施工車輛將占用部分車道，需進行交通安全設施佈設作業。



圖 13 交維布設作業圖



圖 14 本案交維布設示意圖

十一、 植栽移除工程施工管理

表 12 植栽移除工程施工管理標準表

施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處理	管理紀錄	備註
施工前	相關計畫	樹木現況分析、移除、養護、保活及施工作業進度等	施工前	書面審查	1 次	重新提送	植栽移除計畫	
	相關證照	需具備合格修剪證明或造園技術士等專業證明(實際工作經驗2年以上)。	施工前	書面審查	1 次	重新提送	植栽移除計畫	
施工中	樹木移除	枝條枝葉分段剪除，挖掘樹木吊機脫離樹穴，截離現場運棄	★施工中	目視	每次	改善	自主檢查表	
	種植方式及深度	植穴大小是以根球直徑大小1.3-1.5 倍的直徑為宜，深度為根球直徑加深二十公分以上	★施工中	目視、以尺丈量	每次	改善	自主檢查表	
	支柱設立	支柱之方式採三木支架法，接觸部分觀以透氣軟性材料，架設高度約為主幹2/3處。	★施工中	目視、以尺丈量	每次	改善	自主檢查表	
施工後	日常維護	每兩周澆水一次	施工後	目視	每次	改善	自主檢查表	

表 13 植栽移除工程施工自主檢查表

編號：

工程名稱		北屯區敦富九街 12M-5 銜接潭子中興路開闢工程		
分項工程名稱		植栽移除工程	協力廠商	
檢查位置			檢查日期	年 月 日
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施工前	相關計畫	樹木現況分析、移除、養護、保活及施工作業進度等		
	相關證照	需具備合格修剪證明或造園技術士等專業證明(實際工作經驗2年以上)。		
施工中	樹木移除	枝條枝葉分段剪除，挖掘樹木吊搬脫離樹穴，截離現場運棄		
	種植方式及深度	植穴大小是以根球直徑大小1.3-1.5 倍的直徑為宜，深度為根球直徑加深二十公分以上		
	支柱設立	支柱之方式採三木支架法，接觸部分襯以透氣軟性材料，架設高度約為主幹2/3處。		
施工後	日常維護	每兩周澆水一次		

缺失複查結果：

☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片）

☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm-10mm）。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名（檢查人員）：

肆、附件

附件 1- 契約書

正本
臺中市新建工程處
北屯區敦富九街 12M-5 銜接潭子中興路開闢工程
契約書
(案號：114A-014)
機關：臺中市新建工程處
廠商：竣溢營造有限公司
地址：(428)臺中市大雅區三和里建興路 127 號 1 樓
履約期間： 年 月 日～ 年 月 日
電話：04-25601865
傳真：04-25692830
連絡人：
中華民國 年 月 日
